



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského (dále „občanský zákoník“)
mezi:

Čl. I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Psáry
zastoupený: Milanem Váchou, starostou obce
se sídlem: Pražská 137, 252 44 Psáry
IČ: 00241580
Osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Renáta Sedláková, 602 754 834

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AQUATEST a.s.
osoba oprávněná k jednání za spol: Daniel Kraft, předseda představenstva
se sídlem: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
IČ: 44794843
DIČ: CZ44794843
osoba oprávněná k jednání: Daniel Kraft, předseda představenstva
ve věcech technických: Ing. Roman Kříž, samostatný řešitel
dále jen „zhotovitel“

Čl. II. Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v provedení prací a dodávce materiálů stavby - „**Rekonstrukce MVN Nádržka v Psárech**“ dle projektové dokumentace vypracované Projektovým ateliérem Dlabáček s.r.o., Hradec Králové, Gočárova třída 535, PSČ 500 02, z 06/2017, ověřená Ing. Jaroslavem Dlabáčkem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby ČKAIT – 0600353 a stavebního povolení vydaného Městským úřadem Černošice, odbor ŽP, dne 23. 6. 2018 pod č.j. MUCE 19145/2018/OŽP/V/ČO-R.
2. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou cenu, jak je dohodnuto v čl. III. této smlouvy.
3. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli k provedení díla, jsou majetkem objednatele. Zhotovitel předá tyto podklady objednateli zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří dnů, po ukončení této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy.
5. Při zpracovávání díla je zhotovitel povinen dodržovat právní předpisy, ČSN technické normy, ujednání této smlouvy a řídit se předanými výchozími podklady objednatele a jeho pokyny. Zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků a pokynů nebo vady objednatelem předaných podkladů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou.

Čl. III. Cena díla

1. Cena díla činí : 1.222.048,76 Kč + DPH 21% 256.630,- Kč, tj. celkem 1.478.679,- Kč. Cenová nabídka zhotovitele, včetně výkazu výměr je přílohou č. 1 této smlouvy.
2. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla dle této smlouvy. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou.

Čl. IV. Platební podmínky

1. Podkladem pro zaplacení ceny za dílo je faktura vystavená zhotovitelem po předání díla objednateli.
2. Faktura je splatná ve lhůtě 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.
3. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména označení zhotovitele a objednatele, sídlo, IČ, DIČ, číslo faktury, datum vystavení faktury, den splatnosti, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, účel platby – úhrada díla, fakturovaná částka, razítko a podpis oprávněné osoby. Přílohou bude kopie protokolu s podpisem objednatele potvrzujícím převzetí díla.
4. Objednatel je oprávněn doručenou fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže vyúčtovaná cena není v souladu s cenou za provedení předmětu díla sjednanou v této smlouvě nebo faktura neobsahuje náležitosti dle předchozího odstavce tohoto článku. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů začne běžet od doručení nové nebo opravené faktury. Do doby doručení nové nebo opravené faktury není objednatel v prodlení s placením ceny za dílo.
5. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele.

Čl. V. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje :
Zhotovit dílo v termínu od 1. 6. 2018 do 30. 11. 2018.
Dokončit dílo : do 11 týdnů ode dne předání/převzetí staveniště
2. Místo plnění : Psáry, ul. U Nádržky.
3. O převzetí díla bude sepsán písemný protokol (stavební deník).

Čl. VI. Záruka

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předmětu plnění definovanému v této smlouvě a příslušným právním předpisům.
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, za odborné zpracování, za správnost a úplnost a za soulad díla s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem a právními předpisy.
3. Záruční lhůta díla počíná běžet převzetím díla objednatelem a její délka činí 3 roky.
4. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po té, co se o nich dozvěděl.
5. Právo na odstranění vady předmětu díla objednatel u zhotovitele uplatní písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů od doručení reklamace, reklamovanou vadu odstraní.
6. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím chybných podkladů a pokynů předaných objednatelem nebo třetími osobami, pokud na jejich chybnost objednatel neupozornil, ač ji mohl zjistit.

Čl. VII. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele:
 - a) s předáním díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH nejméně však 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení,
 - b) s odstraněním záruční vady dle odst. 5 čl. VI. se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den a neodstraněnou vadu.
2. Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury se sjednávají smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu na účet objednatele ve lhůtě uvedené ve vyúčtování smluvní pokuty.
4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, kterou je možno vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.
5. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

Čl. VIII. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu jednostranně ukončit výpovědí nebo odstoupením. Výpověď i odstoupení musí být písemné, jinak jsou neplatné.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel podstatně nebo nepodstatně poruší ustanovení této smlouvy.
3. Za podstatné porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy se považují zejména případy, kdy
 - a) zhotovitel je v prodlení s řádným předáním díla déle než 10 dnů,
 - b) zhotovitel neoprávněně nebo bezdůvodně přerušil či ukončil provádění díla před jeho řádným dokončením a předáním objednateli,
 - c) zhotovitel při provádění díla postupuje v rozporu s pokyny objednatele.
4. Zjistí-li objednatel nepodstatné porušení smlouvy, je povinen tuto skutečnost písemně sdělit zhotoviteli a poskytnout mu k jeho odstranění přiměřenou lhůtu. Nebude-li ve lhůtě porušení smlouvy odstraněno, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.



5. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě a je účinné od okamžiku doručení druhé smluvní straně.

Čl. IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran formou dodatků podepsaných smluvními stranami. Veškeré dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele včetně výkazu výměr a příloha č. 2. Situace stavby.
3. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si ji před podpisem přečetly a že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Psárech dne15. 6. 2018.....

Za objednatele



Obec Psáry
Milan Vácha
starosta

V Praze dne18. 6. 2018.....

Za zhotovitele



AQUATEST a.s.
Daniel Kraft
předseda představenstva

AQUATEST a.s.
152 00 Praha 5, Geologická 4



④

Schváleno usnesením	nady
Obce Psáry č.	67/13-2018
ze dne11. 6. 2018.....	apjuy

**Obec Psáry
Pražská 137
252 44 Psáry**

„Rekonstrukce MVN Nádržka v Psárech“

Nabídka

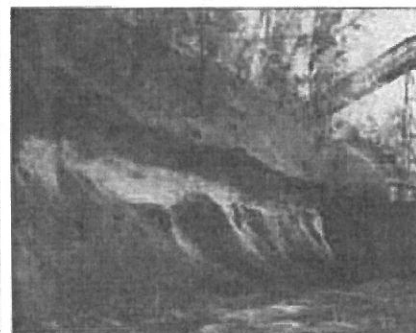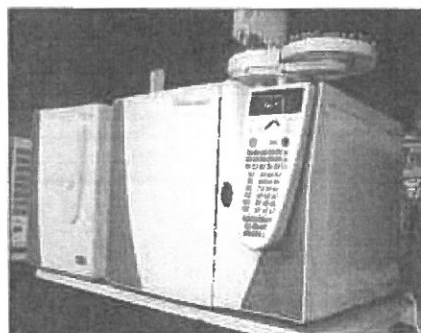

AQUATEST a.s.

Sídlo:	Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
IČO / DIČ:	44794843, CZ44794843
Právní forma:	akciová společnost
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	6900931/0100
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele:	Daniel Kraft, předseda představenstva
Kontaktní osoba:	Ing. Veronika Fořtová
Kontakt:	605 735 541, fořtova@aquatest.cz
www stránky:	www.aquatest.cz
ID datové schránky:	sq9cva8

Slepý rozpočet stavby

Datum: 22.05.2018

Stavba : 0990

Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka

Objednatel : Obec Psáry

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : AQUATEST a.s.

IČO : 44794843
DIČ : CZ44794843

Za zhotovitele :

Za objednatele :



AQUATEST a.s.
152 00 Praha 5, Geologická 4
4

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 222 048,76
DPH	21 %	256 630,00
Cena celkem za stavbu		1 478 679

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
0001 SO-01 Odstranění nánosů	503 048	0	0	0	41,2
0002 SO-02 Návodní zeď	377 470	0	0	0	30,9
0003 SO-03 Výpustné zařízení	169 773	0	0	0	13,9
0004 Panelová komunikace	116 758	0	0	0	9,6
0005 Vedlejší a ostatní náklady	55 000	0	0	0	4,5
Celkem za stavbu	1 222 049	0	0	0	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
0001		0	0	0	0	0,0
0002		0	0	0	0	0,0
0003		0	0	0	0	0,0
0004		0	0	0	0	0,0
0005		0	0	0	0	0,0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	54,8	669 496	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	21,1	258 303	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	2,5	30 463	0	0	0	0
5 Komunikace	6,9	83 865	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0,7	7 982	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	1,9	23 483	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	0,1	1 398	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	7,7	93 540	0	0	0	0

Prorážení otvorů	0,5	5 879	0	0	0	0
Staveništní přesun hmot	3,9	47 642	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	1 222 049	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
0001	SO-01 Odstranění nánosu	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0990	Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka	Náklady na m.j.	0
Projektant	Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. H.Králové	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Psáry		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	503 048 Ztlžené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0 Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0 Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0 Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	503 048 Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
	HZS	0 Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	503 048 Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	503 048 Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		503 048 Kč
DPH	21,0 %		105 640 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			608 688 Kč

Poznámka :

Stavba :	0990 Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka	Rozpočet :
Objekt :	0001 SO-01 Odstranění nánosu	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	503 048	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	503 048	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	0990 Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka	Rozpočet:
Objekt :	0001 SO-01 Odstranění nánosu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	88,00	58,40	5 139,20
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	11,00	42,20	464,20
3	122703601R00	Odstranění nánosu při únosnosti dna 15 - 40 kPa	m3	716,00	155,40	111 266,40
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	40,00	33,40	1 336,00
5	162253102R00	Vodorovné přemístění nánosu, únos.dna 15-40 kPa	m3	716,00	182,00	130 312,00
6	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	696,00	89,30	62 152,80
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	716,00	54,30	38 878,80
8	171103201R00	Ulož. sypaniny do hrází, 100%PS, objem jílu do 20%	m3	40,00	78,50	3 140,00
9	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	188,00	18,40	3 459,20
10	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	19,00	22,50	427,50
11	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	6 960,00	5,65	39 324,00
12	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	1 056,00	18,30	19 324,80
13	181201101R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	188,00	16,70	3 139,60
14	182201101R00	Svahování násypů	m2	19,00	34,90	663,10
15	198000028T00	Příplatek za odvoz zvodnělé zeminy	m3	696,00	120,00	83 520,00
16	000572481	Osivo směs luční	kg	4,00	125,00	500,00
Celkem za		1 Zemní práce				503 047,60

SLEPÝ ROZPOČET

rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
0002	SO-02 Návodní zeď	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0990	Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka	Náklady na m.j.	0
Projektant	Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. H.Králové	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Psáry		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	377 470	Ztlžené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	377 470	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	377 470	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	377 470	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		377 470 Kč
DPH	21,0 %		79 269 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			456 739 Kč

Poznámka :

Stavba :	0990 Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka	Rozpočet :
Objekt :	0002 SO-02 Návodní zeď	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	51 012	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	212 460	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	84 372	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	29 626	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	377 470	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN			0	0

Slepý rozpočet

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Stavba :		0990 Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka			Rozpočet:		
Objekt :		0002 SO-02 Návodní zeď					
Díl: 1		Zemní práce					
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 139,5*0,8*0,8		m3	89,28	250,00	22 320,00
2	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m 94,8-24		m3	70,80	185,00	13 098,00
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním		m3	89,28	79,50	7 097,76
4	199000003R00	Poplatek za skládku hominy 5 - 7		m3	70,80	120,00	8 496,00
Celkem za		1 Zemní práce					51 011,76
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					
5	321214511R00	Zdivo nadzákl. přehrad z lom.kam., na sucho 1 líc		m3	82,00	3 150,00	258 300,00
6	399000000T00	Odpočet použití vybouraného kamene		t	48,00	-955,00	-45 840,00
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce					212 460,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí					
7	961021311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného 72,5+22,3		m3	94,80	890,00	84 372,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí					84 372,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
8	998321011R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité		t	212,38	139,50	29 626,45
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot					29 626,45

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet			
Objekt		JKSO	
0003	SO-03 Výpustné zařízení	SKP	
Stavba		Měrná jednotka	
0990	Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka	Počet jednotek	
Projektant	Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. H.Králové	Náklady na m.j.	0
Zpracovatel projektu		Typ rozpočtu	
Objednatel	Obec Psáry		
Dodavatel			
Rozpočtoval		Zakázkové číslo	
		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	169 773	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	169 773	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	169 773	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	169 773	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		169 773 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		35 652 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč
			205 425 Kč

Poznámka :

Stavba :	0990 Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka	Rozpočet :
Objekt :	0003 SO-03 Výpustné zařízení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	43 207	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	45 843	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	30 463	0	0	0	0
8 Trubní vedení	7 982	0	0	0	0
91 Dopřihující práce na komunikaci	23 483	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	1 398	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	9 168	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 231	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	169 773	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN			0	0

Stavba :	0990 Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka	Rozpočet :
Objekt :	0003 SO-03 Výpustné zařízení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	43 207	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	45 843	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	30 463	0	0	0	0
8 Trubní vedení	7 982	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	23 483	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	1 398	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	9 168	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 231	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	169 773	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN			0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	0990 Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka	Rozpočet:
Objekt :	0003 SO-03 Výpustné zařízení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	114203103R00	Rozebrání dlažeb z lom.kamene do MC, spáry MC	m3	14,60	871,00	12 716,60
2	115001104R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm	m	6,00	517,00	3 102,00
3	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	40,00	58,40	2 336,00
4	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	5,00	42,20	211,00
5	122301401R00	Vykopávky v zemniku v hor. 4 do 100 m3	m3	15,00	139,00	2 085,00
6	123202101R00	Vykopávky zářezů v hor.3 do 1000 m3 2*4*1,5	m3	12,00	133,00	1 596,00
7	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 1*0,9*0,8	m3	0,72	238,00	171,36
8	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 0,6*0,3*2+0,5*0,4*(1,6*2+1,8*2)+0,4*0,15*(0,6+3,6)	m3	1,97	566,00	1 116,15
9	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m 12+1,97+0,72	m3	14,69	89,30	1 311,82
10	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	15,00	106,00	1 590,00
11	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	15,35	185,00	2 839,75
12	172103102R00	Zřízení těsnícího jádra, 100%PS, š.vrstvy do 3,0 m	m3	15,00	156,00	2 340,00
13	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	146,90	7,12	1 045,93
14	199000000R00	Poplatek za skladku sutí	t	30,70	350,00	10 745,00
Celkem za 1 Zemní práce						43 206,61
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
15	321311113R00	Konstrukce přehrad z prostého betonu V8 T50 B 20	m3	0,90	5 610,00	5 049,00
16	331122011R00	Montáž sloupů ze ŽB hmotnosti do 1 t	kus	1,00	1 844,00	1 844,00
17	5930006	Požerák prefa 2,5m atyp	ks	1,00	48 950,00	38 950,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						45 843,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
18	451311521R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 15 cm 3*6-2*1,8+0,8*1,6+0,9*1,9	m2	17,39	525,00	9 129,75
19	452218142R00	Zajišťovací práh z upraveného lom. kamene, na MC 0,4*0,6*(0,6+3,2)	m3	0,91	3 420,00	3 119,04
20	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 0,82*2,5*0,2	m3	0,41	2 630,00	1 078,30
21	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí 0,2*2,5*2	m2	1,00	302,00	302,00
22	465513227R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm	m2	17,39	968,00	16 833,52
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						30 462,61
Díl: 8 Trubní vedení						
23	871373121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300	m	3,40	124,00	421,60
24	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 3,14*0,5*2,5*0,15	m3	0,59	2 600,00	1 530,62
25	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu 0,35*2,5*2	m2	1,75	314,00	549,50
26	28611122	Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 315x7,7x5000 mm	kus	1,00	5 480,00	5 480,00
Celkem za 8 Trubní vedení						7 981,72
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
27	919511112R00	Čela propustku z lomového kamene, krycí deska ŽB 0,6*1,7*2+0,5*1,6*0,8*2+0,5*0,7*1,6+0,5*2,1*0,8*2+0,5*2,1*1,15	m3	6,77	3 470,00	23 483,23
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						23 483,23
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						
28	934956124R00	Hradítka z dubového dřeva tloušťky 5 cm	m2	0,65	2 150,00	1 397,50

Slepý rozpočet

Stavba :	0990 Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka	Rozpočet:
Objekt :	0003 SO-03 Výpustné zařízení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,5*0,65*2		0,65		
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				1 397,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
29	960191241R00	Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů	m3	8,00	890,00	7 120,00
30	961041211R00	Bourání mostních základů z betonu prostého	m3	3,15	650,00	2 047,50
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				9 167,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
31	998324011R00	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	53,00	155,30	8 231,18
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				8 231,18

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
0004	Panelová komunikace	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0990	Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka	Náklady na m.j.	0
Projektant	Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. H.Králové	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Psáry		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	116 758	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	116 758	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	116 758	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	116 758	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		116 758 Kč
DPH	21,0 %		24 519 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			141 277 Kč

Poznámka :

Stavba :	0990 Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka	Rozpočet :
Objekt :	0004 Panelová komunikace	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dotyky	Montáž	UZO
Zemní práce	17 230	0	0	0	0
5 Komunikace	83 865	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	5 879	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 784	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	116 758	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba : **0990 Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka**
 Objekt : **0004 Panelová komunikace**
Rozpočet:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů				
2	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. těžené tl. 10 cm	m2	90,00	39,30	3 537,00
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 18*5*0,2	m2	90,00	91,90	8 271,00
4	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m3	18,00	29,20	525,60
	Celkem za	1 Zemní práce	m2	90,00	54,40	4 896,00
Díl: 5 Komunikace						
5	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 10 cm 18*5	m2	90,00	62,50	5 625,00
6	584921111R00	Osazení panelů z předpjatého betonu do 6 t/ks	m2	90,00	226,00	20 340,00
7	593800110030	Panel silniční KZD 1 300x200x15 cm 90/6	kus	15,00	3 860,00	57 900,00
	Celkem za	5 Komunikace				83 865,00
Díl: 97 Prorážení otvorů						
8	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	t	51,12	115,00	5 878,80
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				5 878,80
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
9	998226011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt montovaný	t	60,36	162,10	9 784,21
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				9 784,21

SLEPÝ ROZPOČET

Roční rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
0005	Vedlejší a ostatní náklady	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0990	Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka	Náklady na m.j.	0
Projektant	Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. H.Králové	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Psáry		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	55 000	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	55 000	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	55 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	55 000	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		55 000 Kč
DPH	21,0 %		11 550 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			66 550 Kč

Poznámka :

Stavba :	0990 Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka	Rozpočet :
Objekt :	0005 Vedlejší a ostatní náklady	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	55 000	0	0	0	
CELKEM OBJEKT	55 000	0	0	0	

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN			0	0

Slepý rozpočet

Stavba : **0990 Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka**
Objekt : **0005 Vedlejší a ostatní náklady**

Rozpočet:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	100000026T00	Geodetické vytyčení stavby oprávněnou osobou	ks	1,00	15 000,00	15 000,00
2	100000046T00	Geodet.zaměření skut.provedení 3paré+1xelektroni	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
3	100000126T00	Zřízení a likvidace ZS	%	0,03	1 200 000,00	30 000,00
	Celkem za	1 Zemní práce				55 000,00
