

**Nikola Alferyová**

3

**Od:** Hana Skacelova <brno@kavyl.cz>  
**Odesláno:** 23. května 2018 10:47  
**Komu:** asistentka  
**Předmět:** cenová nabídka  
**Přílohy:** 20180523103723851.pdf

Dobrý den,

zasíláme cenovou nabídku na akci "Rekonstrukce MVN Nádržka v Psárech".

s pozdravem Hana Skácelová, obchodní oddělení, KAVYL, spol.s r.o.

--

S pozdravem


Hana Skácelová  
asistentka jednatele  
KAVYL, spol. s r.o.

tel.: 603 162 344  
Mohelno 563, 675 75 Mohelno  
(adresa provozovna: Bohunická 251/37, 619 00 Brno - Horní Heršpice)  
IČ: 49975358  
DIČ: CZ49975358  
[www.kavyl.cz](http://www.kavyl.cz)



Nabídka na veřejnou zakázku na stavební práce

## „Rekonstrukce MVN Nádržka v Psárech“

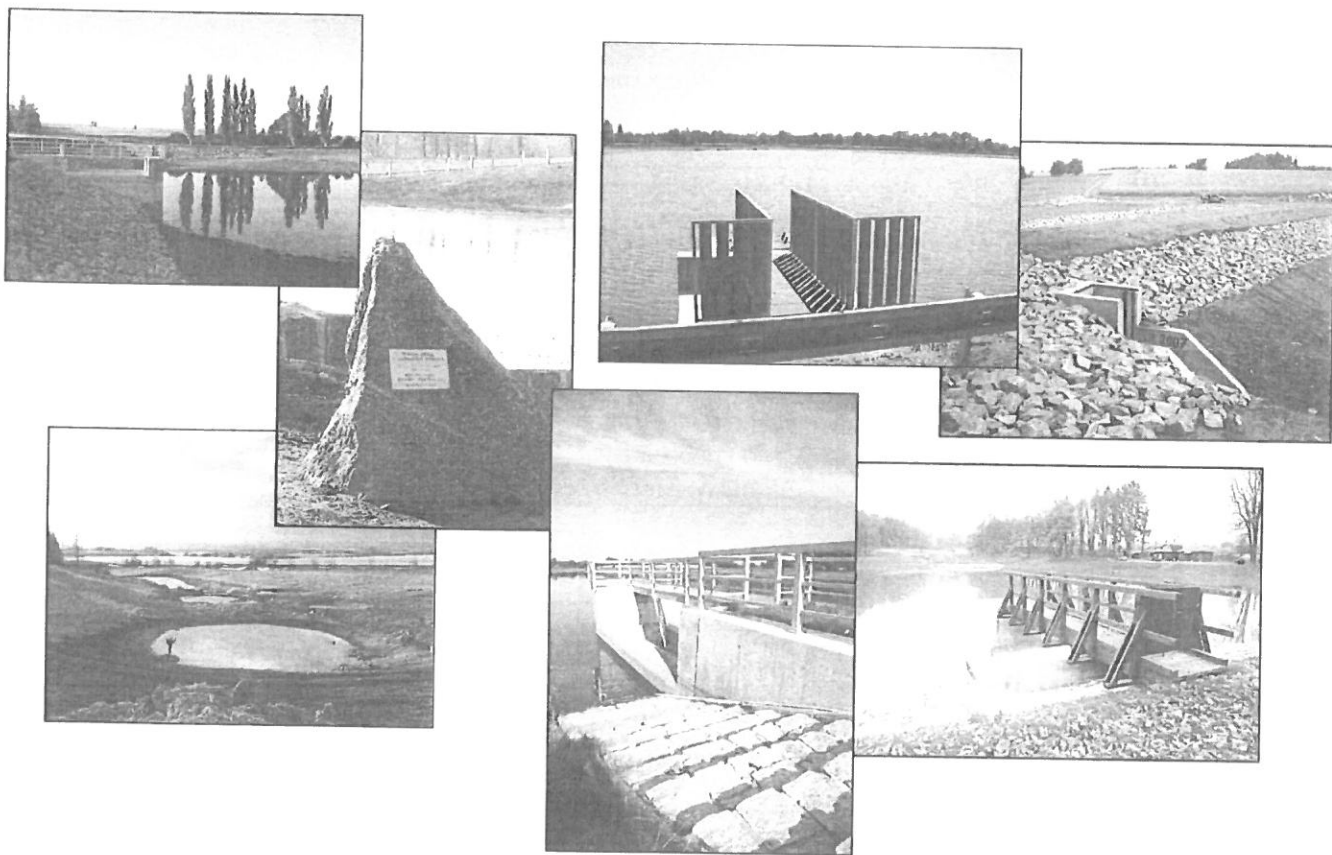

**KAVYL, spol. s r.o.**  
Mohelno 563  
675 75 MOHELNO  
IČ: 499 75 358  
DIČ: CZ 49975358

e-mail: [brno@kavyl.cz](mailto:brno@kavyl.cz)  
tel: 541 243 986

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Brně  
oddíl C, vložka 13954

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	8. února 1994
<b>Spisová značka:</b>	C 13954 vedená u Krajského soudu v Brně
<b>Obchodní firma:</b>	KAVYL, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	č.p. 563, 675 75 Mohelno
<b>Identifikační číslo:</b>	499 75 358
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>Předmět podnikání:</b>	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování truhlářství, podlahářství zámečnictví, nástrojářství výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona opravy silničních vozidel opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů Zednictví silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí zemědělská výroba
<b>Statutární orgán:</b>	
<b>jednatel:</b>	Ing. SLAVOMIL DOKULIL, dat. nar. 8. dubna 1956 V Zahradách 200, 675 73 Kralice nad Oslavou Den vzniku funkce: 22. září 2005
<b>Počet členů:</b>	1
<b>Způsob jednání:</b>	Jednatel zastupuje společnost samostatně ve všech záležitostech.
<b>Společníci:</b>	
<b>Společník:</b>	Ing. SLAVOMIL DOKULIL, dat. nar. 8. dubna 1956 V Zahradách 200, 675 73 Kralice nad Oslavou
<b>Podíl:</b>	<b>Vklad:</b> 560 000,- Kč <b>Splaceno:</b> 560 000,- Kč <b>Obchodní podíl:</b> 100% <b>Druh podílu:</b> základní <b>Kmenový list:</b> nebyl vydán
<b>Základní kapitál:</b>	560 000,- Kč
<b>Ostatní skutečnosti:</b>	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

2


## **Veřejný rejstřík - výpisy platných**

Ověřuji pod pořadovým číslem **V-1245/2018**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **JUDr. KOSTŘICOVÁ VLADIMÍRA**

**V Brně dne 02.05. 2018**

Podpis .....

  
Místo: Vladimíra Kostřicová  
JUDr.  
IČO: 123456789



## SEZNAM OBDOBNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ

### REFERENCE NÁDRŽE

#### **Rekonstrukce a odbahnění vodní nádrže Bušínov**

Rekonstrukce vodní nádrže v k. ú. Dolní Bušínov , okres Šumperk. Součástí díla bylo odtěžení sedimentu a jeho zapravení na určené pozemky, úprava v zátopě - vybudování loviště a kádiště určené k výlovu. Dále byla rekonstruována hráz nádrže a sdružený objekt nádrže. Cena díla 5,785 mil. Kč, termín realizace 1/2013 – 8/2013. Zadavatel Český rybářský svaz m.o., Severovýchod 16, 789 01 Zábřeh na Moravě, předseda Ing. Ervín Matýsek, tel. 583 418 348, crs.zabreh@seznam.cz. Stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

#### **Vodní nádrž Na Vrščích**

Výstavba nové vodní nádrže v k. ú Pašice, okres České Budějovice. Součástí díla byla výstavba nové vodní nádrže - odtěžení sedimentu, vytvoření nové sypané hráze, vytvoření výpustného zařízení včetně monolitického požeráku a bezpečnostního přelivu, vytvoření nezpevněné polní cesty, provedení vegetačních úprav. Cena díla 4,815 mil. Kč, termín realizace 11/2014 – 9/2015. Zadavatel Jiří Chalupa, Pašice 22, 373 41 pošta Pištín. Stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

#### **Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o.s. MO Oslavany – výstavba rybníků**

Výstavbu 4 rybníků se zaměřením na výrobu reofilních druhů ryb formou jednoletého až dvouletého plůdku na celkové ploše 3 609 m<sup>2</sup> v k.ú. Oslavany, okres Brno - venkov. Součástí díla byla výstavba vodních nádrže – odstranění sedimentů, výstavba hrází, přítokových a odtokových koryt vodního díla, výstavba loviště a kádiště, rozdělovacích a napouštěcích objektů. Cena díla 3,283 mil. Kč, termín realizace 7/2016 – 12/2016. Zadavatel Moravský rybářský svaz, místní organizace Oslavany, Nádražní 1, 664 12 Oslavany, IČ: 00546879, předseda Zdeněk Kocáb, tel. 725 022 011. Stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

### **Oprava soustavy rybníku Vodice – Nadýmač v k.ú. Uhříněves po povodni z červan 2013**

Oprava a odbahnění soustavy rybníků Velké Vodice a Malé Vodice a Nadýmače II. v k.ú. Praha 22. Součástí díla bylo odstranění sedimentů, oprava kamenného opevnění oprava hráze, výpusti a bezpečnostního přelivu. Cena díla 2,555 mil. Kč, termín realizace 2/2016 – 7/2016. Zadavatel Městská část Praha 22, Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha IČ: 00240915, starosta Ing. Martin Turnovský, tel. 271 071 822, sekretariat@praha22.cz. Stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

### **Odbahnění a rekonstrukce rybníka Borový**

Odbahnění a rekonstrukce rybníka Borový v k.ú. Markvartice, okres Jihlava. Součástí díla byla obnova vodní nádrže – odtěžení sedimentu, oprava sypané hráze, rekonstrukce spodní výpusti a bezpečnostního přelivu. Dále byla vytvořena izolovaná mokřadní plocha tří vodních tůní. Cena díla 1,930 mil. Kč, termín realizace 1/2014 – 12/2014. Zadavatel Obec Markvartice, Markvartice 82, 588 56 pošta Telč, IČ: 00488631, starosta Josef Nedvěď, tel. 567 377 118, markvartice@ji.cz. Stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

**Kavyl**  
Kavyl, s.p.a.  
Mohlého 568/675 78  
IČ: 49765358, DIČ: CZ 49765358



## REFERENCE

**Zadavatel:** Český rybářský svaz, Místní organizace, Severovýchod 16,  
789 01 Zábřeh na Moravě ( zastoupena Ing. Ervínem Matýskem,  
předsedou MO)

**Zhotovitel:** Kavyl, spol. s r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno  
DIČ: CZ499 753 58 , vedená u KS Brno, odd. C, vl. 13954

**Název akce:** „Rekonstrukce a odbahnění vodní nádrže Bušínov“

v k.ú. Dolní Bušínov , okres Šumperk

**Doba plnění díla:** 1/2013 – 8/2013

**Celkový finanční objem:** 5 785 403,- Kč bez DPH

**Charakter akce:**

Odbahnění nádrže – odstranění 14960 m<sup>3</sup> sedimentu a zapravení sedimentu na určené pozemky.  
Úprava v zátopě – vybudování loviště a kádiště určené k výlovu ryb ze zátopy.  
Rekonstrukce hráze nádrže – rekonstrukce kamenné zídky, položení 290 m<sup>2</sup> dlažby a  
vybudování nového schodiště.  
Rekonstrukce sdruženého objektu nádrže spočívající v rekonstrukci betonových ploch, výměnu  
šoupat a opevnění koryta nádrže.

Akce byla realizována kvalifikovanými pracovníky zaměstnanými ve firmě Kavyl, spol.  
s r.o. Mohelno.

Stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

Zadavatel hodnotí provedení akce jako velmi kvalitní a veškeré parametry a termíny  
byly dodrženy.

  
Český rybářský svaz  
místní organizace  
ICO 150 50 511  
789 01 ZÁBŘEH



## REFERENCE- osvědčení

**Zadavatel:** Moravský rybářský svaz, místní organizace Oslavany,  
Nádražní 1, 664 12 Oslavany, IČ: 00546879  
Zastoupena předsedou pobočného spolku Zdeňkem Kocábem

**Zhotovitel:** Kavyl, spol. s r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno  
DIČ: CZ 499 753 58, vedená u KS Brno, odd. C, vl. 13954

**Název akce:** Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRS, o.s.  
MO Oslavany – výstavba rybníků  
k.ú. Oslavany, okres Brno - venkov, Jihomoravský kraj

**Doba plnění díla:** 7/2016 – 12/2016

**Celkový finanční objem:** 3 324 999,89 Kč bez DPH

### **Charakter akce:**

Jednalo se o výstavbu 4 vodních nádrží se zaměřením na výrobu reofilních druhů ryb formou jednoletého až dvouletého plůdku na celkové ploše 3 609 m<sup>2</sup>. Součástí stavebních prací

bylo odstranění sedimentů, výstavba hrází, přítokových a odtokových koryt vodního díla, výstavba loviště a kádiště, rozdělovacích a napouštěcích objektů.

Akce byla realizována kvalifikovanými pracovníky zaměstnanými ve firmě Kavyl, spol. s r.o. Mohelno. Stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

Zadavatel hodnotí provedení akce jako velmi kvalitní a veškeré parametry a termíny byly dodrženy.

V Oslavanech dne ..... 6. 7. 2018 .....

Moravský rybářský svaz, z.s.  
pobočný spolek Oslavany  
Nádražní 1145/24/664 12 Oslavany  
IČ: 00546879

Zdeňk Kocáb, předseda spolku

## REFERENCE- osvědčení

Zadavatel: Městská část Praha 22, Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha,  
IČ:00240915,  
zastoupena Ing. Martinem Turnovským, starostou

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno  
DIČ: CZ 499 753 58, vedená u KS Brno, odd. C, vl. 13954

Název akce: Oprava soustavy rybníku Vodice - Nadýmač v k. ú.  
Uhříněves po povodni z června 2013  
v k.ú. Uhříněves, kraj Hlavní město Praha

Doba plnění díla: 2/2016 – 7/2016

Celkový finanční objem: 2 555 254,- Kč bez DPH

### Charakter akce:

Jedná se o opravu a odbahnění soustavy rybníků Velké Vodice a rybníku Malé Vodice a Nadýmače II.

Odstranění sedimentů z nádrží, opravy kamenného opevnění v místě rozdělovacího objektu, nátoky do zátopy a nad stavidlovým uzávěrem. Lokální opravy kamenného pohozu návodní strany hráze, doplnění kamenné rovnániny pod funkčními objekty - výpustí a přelivem. Oprava porušeného zdiva, bezpečnostního přelivu, porušeného opevnění skluzu a odpadu od přelivu  
Oprava podemleté hráze kamenného zdiva sruženého objektu a stabilizace odpadního koryta balvanitou úpravou rybníku Malé Vodice a oprava podemletých břehů v konci vzdutí Nadýmače II.

Akce byla realizována kvalifikovanými pracovníky zaměstnanými ve firmě Kavyl, spol. s r.o. Mohelno.

Stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

Zadavatel hodnotí provedení akce jako velmi kvalitní a veškeré parametry a termíny byly dodrženy.

V Praze dne 13. 1. 2017



## REFERENCE- osvědčení

Zadavatel: Obec Markvartice, Markvartice 82, 588 56 Telč  
IČ: 00488631,  
zastoupena starostou obce panem Josefem Nedvědem

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno  
DIČ: CZ 499 753 58, vedená u KS Brno, odd. C, vl. 13954

Název akce: Odbahnění a rekonstrukce rybníka Borový  
v k.ú. Markvartice, okres Jihlava, kraj Vysočina

Doba plnění díla: 1/2014-12/2014

Celkový finanční objem: 1 930 688,- Kč bez DPH

### Charakter akce:

Obnova původní vodní nádrže v krajině:

- odtěžení 1 600 m<sup>3</sup> sedimentu
- rekonstrukce spodní výpusti - vytvoření nového nátokového objektu, přívodního potrubí a šachty výpusti (požeráku)
- oprava sypané zemní hráze nádrže v délce 94 metrů
- oprava bezpečnostního přelivu - opevnění provedeno kamennou dlažbou do betonu s délkou přelivné hrany 10 metrů
- vytvoření izolované mokřadní plochy o rozloze 426 m<sup>2</sup> tvořenou 3 samostatnými tůňemi o rozloze 51 m<sup>2</sup>, 75 m<sup>2</sup> a 115 m<sup>2</sup>
- úpravy terénu a zatravnění okolí

Akce byla realizována kvalifikovanými pracovníky zaměstnanými ve firmě Kavyl, spol. s r.o. Mohelno.

Stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

Zadavatel hodnotí provedení akce jako velmi kvalitní a veškeré parametry a termíny byly dodrženy.

V Brně dne 20.1.2015

*Josef Nedvěd*

Obec Markvartice  
588 56 Telč

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského (dále „občanský zákoník“)  
mezi:

### Čl. I. Smluvní strany

**Objednatel:** Obec Psáry  
zastoupený: Milanem Váchou, starostou obce  
se sídlem: Pražská 137, 252 44 Psáry  
IČ: 00241580

Osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických: Renáta Sedláková, 602 754 834

*dále jen „objednatel“*

**Zhotovitel:** KAVYL, spol. s r.o.  
osoba oprávněná k jednání za spol: Ing. Slavomil Dokulil, jednatel  
se sídlem: Mohelno č.p. 563, 675 75 Mohelno  
IČ: 49975358  
DIČ: CZ49975358

osoba oprávněná k jednání Ing. Slavomil Dokulil  
ve věcech technických: Vladimír Troščák  
*dále jen „zhotovitel“*

### Čl. II. Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v provedení prací a dodávce materiálů stavby - „**Rekonstrukce MVN Nádržka v Psárech**“ dle projektové dokumentace vypracované Projektovým ateliérem Dlabáček s.r.o., Hradec Králové, Gočárova třída 535, PSČ 500 02, z 06/2017, ověřená Ing. Jaroslavem Dlabáčkem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby ČKAIT – 0600353 a stavebního povolení vydaného Městským úřadem Černošice, odbor ŽP, dne 23. 6. 2018 pod č.j. MUCE 19145/2018/OŽP/V/ČO-R.
2. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou cenu, jak je dohodnuto v čl. III. této smlouvy.
3. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli k provedení díla, jsou majetkem objednatele. Zhotovitel předá tyto podklady objednateli zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří dnů, po ukončení této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy.
5. Při zpracovávání díla je zhotovitel povinen dodržovat právní předpisy, ČSN technické normy, ujednání této smlouvy a řídit se předanými výchozími podklady objednatele a jeho pokyny. Zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků a pokynů nebo vady objednatelem předaných podkladů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou.

### **Čl. III. Cena díla**

1. Cena díla činí : 1 475 564,- Kč + DPH 21% 309 868,- Kč, tj. celkem 1 785 432,- Kč. Cenová nabídka zhotovitele, včetně výkazu výměr je přílohou č. 1 této smlouvy.
2. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla dle této smlouvy. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou.

### **Čl. IV. Platební podmínky**

1. Podkladem pro zaplacení ceny za dílo je faktura vystavená zhotovitelem po předání díla objednateli.
2. Faktura je splatná ve lhůtě 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.
3. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména označení zhotovitele a objednatele, sídlo, IČ, DIČ, číslo faktury, datum vystavení faktury, den splatnosti, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, účel platby – úhrada díla, fakturovaná částka, razítko a podpis oprávněné osoby. Přílohou bude kopie protokolu s podpisem objednatele potvrzujícím převzetí díla.
4. Objednatel je oprávněn doručenu fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže vyúčtovaná cena není v souladu s cenou za provedení předmětu díla sjednanou v této smlouvě nebo faktura neobsahuje náležitosti dle předchozího odstavce tohoto článku. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů začne běžet od doručení nové nebo opravené faktury. Do doby doručení nové nebo opravené faktury není objednatel v prodlení s placením ceny za dílo.
5. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele.

### **Čl. V. Doba a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje :  
Zhotovit dílo v termínu od 1. 6. 2018 do 30. 11. 2018.  
Dokončit dílo : do 11 týdnů ode dne předání/převzetí staveniště
2. Místo plnění : Psáry, ul. U Nádržky.
3. O převzetí díla bude sepsán písemný protokol (stavební deník).

## **Čl. VI. Záruka**

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předmětu plnění definovanému v této smlouvě a příslušným právním předpisům.
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, za odborné zpracování, za správnost a úplnost a za soulad díla s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem a právními předpisy.
3. Záruční lhůta díla počíná běžet převzetím díla objednatelem a její délka činí 3 roky.
4. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po té, co se o nich dozvěděl.
5. Právo na odstranění vady předmětu díla objednatel u zhotovitele uplatní písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů od doručení reklamace, reklamovanou vadu odstraní.
6. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím chybných podkladů a pokynů předaných objednatelem nebo třetími osobami, pokud na jejich chybnost objednatele neupozornil, ač ji mohl zjistit.

## **Čl. VII. Sankce**

1. Pro případ prodlení zhotovitele:
  - a) s předáním díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH nejméně však 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení,
  - b) s odstraněním záruční vady dle odst. 5 čl. VI. se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den a neodstraněnou vadu.
2. Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury se sjednávají smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu na účet objednatele ve lhůtě uvedené ve vyúčtování smluvní pokuty.
4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, kterou je možno vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.
5. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

## **Čl. VIII. Ukončení smluvního vztahu**

1. Smluvní strany mohou smlouvu jednostranně ukončit výpovědí nebo odstoupením. Výpověď i odstoupení musí být písemné, jinak jsou neplatné.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel podstatně nebo nepodstatně poruší ustanovení této smlouvy.
3. Za podstatné porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy se považují zejména případy, kdy
  - a) zhotovitel je v prodlení s řádným předáním díla déle než 10 dnů,
  - b) zhotovitel neoprávněně nebo bezdůvodně přerušil či ukončil provádění díla před jeho řádným dokončením a předáním objednateli,
  - c) zhotovitel při provádění díla postupuje v rozporu s pokyny objednatele.
4. Zjistí-li objednatel nepodstatné porušení smlouvy, je povinen tuto skutečnost písemně sdělit zhotoviteli a poskytnout mu k jeho odstranění přiměřenou lhůtu. Nebude-li ve lhůtě porušení smlouvy odstraněno, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě a je účinné od okamžiku doručení druhé smluvní straně.

#### Čl. IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran formou dodatků podepsaných smluvními stranami. Veškeré dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele včetně výkazu výměr a příloha č. 2. Situace stavby.
3. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si ji před podpisem přečetly a že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Psárech dne .....

V Mohelně dne 18.5.2018

Za objednatele

Za zhotovitele

**Kavyl**

Kavyl, spol. s r.o.  
Mohelná 563, 678 75  
IČ: 260 75 346 / DIČ: CZ 260 75 346



---

Milan Vácha  
starosta

---

Ing. Slavomil Dokulil  
jednatel

## SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: VS2018/049

**Stavba:** Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka

JKSO:

Místo: Psáry

CC-CZ:

Datum: 15. 5. 2018

Objednatel:

Obec Psáry

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. HK

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Franta, Kincl

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 475 564,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 475 564,00</b>
DPH základní 21,00% ze	1 475 563,62
DPH snížená 15,00% ze	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>	<b>1 785 432,00</b>

**Projektant**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Zpracovatel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Objednavatel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Zhotovitel**



Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: VS2018/049

**Stavba:** Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka

Místo: Psáry

Datum: 15. 5. 2018

Objednatel: Obec Psáry

Projektant: Projektový ateliér Dlabáček s

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel: Franta, Kincl

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>1 475 563,62</b>	<b>1 785 431,98</b>
0001	SO-01 Odstranění nánosů	435 088,70	526 457,33
0002	SO-02 Návodní zeď	605 209,18	732 303,11
0003	SO-03 Výpustné zařízení	258 838,95	313 195,13
0004	0004 Panelová komunikace	120 637,44	145 971,30
0005	0005 Vedlejší a ostatní náklady	55 789,35	67 505,11
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>1 475 563,62</b>	<b>1 785 431,98</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka

**Objekt:** 0001 - SO-01 Odstranění nánosů

JKSO:

Místo: Psáry

CC-CZ:

Datum: 15. 5. 2018

Objednatel:

Obec Psáry

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. HK

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Franta, Kincl

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	435 088,70
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>435 088,70</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	435 088,70	91 368,63
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>526 457,33</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka

**Objekt: 0001 - SO-01 Odstranění nánosů**

Místo: Psáry

Datum: 15. 5. 2018

Objednatel: Obec Psáry

Projektant: Projektový ateliér Dlabáček s.r.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel: Franta, Kincl

Kód · Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>435 088,70</b>
1 - Zemní práce	435 088,70
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>435 088,70</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka

Objekt: 0001 - SO-01 Odstranění nánosů

Místo: Psáry

Datum: 15. 5. 2018

Objednatel: Obec Psáry

Projektant: Projektový ateliér Dlabáček s.r.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel: Franta, Kincl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**435 088,70**

### 1 - Zemní práce

**435 088,70**

1	K	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	88,000	82,00	7 216,00
2	K	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	11,000	42,20	464,20
3	K	122703601R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna 15 - 40 kPa	m3	716,000	188,00	134 608,00
4	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	40,000	34,60	1 384,00
5	K	162253102R00	Vodorovné přemístění nánosů, únos.dna 15-40 kPa	m3	716,000	155,00	110 980,00
6	K	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	696,000	82,00	57 072,00
7	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	716,000	41,00	29 356,00
8	K	171103201R00	Ulož. sypaniny do hrází,100%P5, objem jílu do 20%	m3	40,000	80,20	3 208,00
9	K	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	188,000	5,50	1 034,00
10	K	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	19,000	7,00	133,00
11	K	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	6 960,000	9,00	62 640,00
12	K	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	1 056,000	8,00	8 448,00
13	K	181201101R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	188,000	8,00	1 504,00
14	K	182201101R00	Svahování násypů	m2	19,000	36,50	693,50
15	K	199000028T00	Příplatek za odvoz zvodnělé zeminy	m3	696,000	23,00	16 008,00
16	M	000572481	Osivo směs luční	kg	4,000	85,00	340,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka

**Objekt:** 0002 - SO-02 Návodní zeď

JKSO:

Místo: Psáry

CC-CZ:

Datum: 15. 5. 2018

Objednatel:

Obec Psáry

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. HK

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Franta, Kincl

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

605 209,18

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**605 209,18**

DPH základní

21,00%

ze

605 209,18

127 093,93

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**732 303,11**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka

Objekt: 0002 - SO-02 Návodní zeď

Místo: Psáry

Datum: 15. 5. 2018

Objednatel: Obec Psáry

Projektant: Projektový ateliér Dlabáček s.r.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel: Franta, Kincl

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>605 209,18</b>
1 - Zemní práce	106 853,66
3 - Svislé a kompletní konstrukce	252 836,00
96 - Bourání konstrukcí	188 178,00
99 - Staveništní přesun hmot	57 341,52
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>605 209,18</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka

**Objekt:** 0002 - SO-02 Návodní zeď

Místo: Psáry Datum: 15. 5. 2018  
 Objednatel: Obec Psáry Projektant: Projektový ateliér Dlabáček s.r.  
 Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno Zpracovatel: Franta, Kincl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**605 209,18**

### 1 - Zemní práce

**106 853,66**

1	K	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 100 m3 139,5*0,8*0,8	m3	89,280	550,00	49 104,00
			Součet		89,280		89,280
2	K	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 do 10000 m 94,8-24	m3	70,800	255,00	18 054,00
			Součet		70,800		70,800
3	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	89,280	83,80	7 481,66
4	K	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	70,800	455,00	32 214,00

### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**252 836,00**

5	K	321214511R00	Zdivo nadzákl. přehrad z lom.kam., na sucho 1 líc	m3	82,000	2 978,00	244 196,00
6	K	399000000T00	Odpočet použití vybouraného kamene	t	48,000	180,00	8 640,00

### 96 - Bourání konstrukcí

**188 178,00**

7	K	961021311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného 72,5+22,3	m3	94,800	1 985,00	188 178,00
			Součet		94,800		94,800

### 99 - Staveništní přesun hmot

**57 341,52**

8	K	998321011R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	212,376	270,00	57 341,52
---	---	--------------	--	---	---------	--------	-----------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka

**Objekt: 0003 - SO-03 Výpustné zařízení**

JKSO:

Místo: Psáry

CC-CZ:

Datum: 15. 5. 2018

Objednatel:

Obec Psáry

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. HK

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Franta, Kincl

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	258 838,95
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>258 838,95</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	258 838,95	54 356,18
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>313 195,13</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka

Objekt: 0003 - SO-03 Výpustné zařízení

Místo: Psáry

Datum: 15. 5. 2018

Objednatel: Obec Psáry

Projektant: Projektový ateliér Dlabáček s.r.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel:

Franta, Kincl

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>258 838,95</b>
1 - Zemní práce	51 190,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	69 353,50
4 - Vodorovné konstrukce	37 622,13
8 - Trubní vedení	5 771,19
91 - Doplnující práce na komunikaci	34 672,46
93 - Dokončovací práce inženýrských staveb	1 430,00
96 - Bourání konstrukcí	43 640,60
99 - Staveništní přesun hmot	15 158,57
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>258 838,95</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka

Objekt: 0003 - SO-03 Výpustné zařízení

Místo: Psáry

Datum: 15. 5. 2018

Objednatel: Obec Psáry

Projektant: Projektový ateliér Dlabáček s.r.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel: Franta, Kincl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

258 838,95

### 1 - Zemní práce

51 190,50

1	K	114203103R00	Rozebrání dlažeb z lom.kamene do MC, spáry MC	m3	14,600	926,00	13 519,60
2	K	115001104R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm	m	6,000	540,00	3 240,00
3	K	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	40,000	82,00	3 280,00
4	K	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	5,000	42,20	211,00
5	K	122301401R00	Výkopávky v zemníku v hor. 4 do 100 m3	m3	15,000	146,00	2 190,00
6	K	123202101R00	Výkopávky zářezů v hor.3 do 1000 m3	m3	12,000	139,00	1 668,00
			2*4*1,5		12,000		
			Součet		12,000		
7	K	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	0,720	251,00	180,72
			1*0,9*0,8		0,720		
			Součet		0,720		
8	K	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	1,972	600,00	1 183,20
			0,6*0,3*2+0,5*0,4*(1,6*2+1,8*2)+0,4*0,15*(0,6+3,6)		1,972		
			Součet		1,972		
9	K	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	14,690	90,70	1 332,38
			12+1,97+0,72		14,690		
			Součet		14,690		
10	K	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	15,000	108,00	1 620,00
11	K	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	15,350	298,00	4 574,30
12	K	172103102R00	Zřízení těsnicího jádra, 100%PS, š.vrstvy do 3,0 m	m3	15,000	164,00	2 460,00
13	K	181006111R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	146,900	12,00	1 762,80
14	K	199000000R00	Poplatek za skladku sutí	t	30,700	455,00	13 968,50

### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

69 353,50

15	K	321311113R00	Konstrukce přehrad z prostého betonu V8 T50 B 20	m3	0,900	5 125,00	4 612,50
16	K	331122011R00	Montáž sloupů ze ŽB hmotnosti do 1 t	kus	1,000	8 741,00	8 741,00
17	M	5930006	Požerák prefa 2,5m atyp	ks	1,000	56 000,00	56 000,00

### 4 - Vodorovné konstrukce

37 622,13

18	K	451311521R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 15 cm	m2	17,390	410,00	7 129,90
			3*6-2*1,8+0,8*1,6+0,9*1,9		17,390		
			Součet		17,390		
19	K	452218142R00	Zajišťovací práh z upraveného lom. kamene, na MC	m3	0,912	3 510,00	3 201,12
			0,4*0,6*(0,6+3,2)		0,912		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		0,912		
20	K	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 0,82*2,5*0,2	m3	0,410	2 640,00	1 082,40
			Součet		0,410		
21	K	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí 0,2*2,5*2	m2	1,000	315,00	315,00
			Součet		1,000		
22	K	465513227R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm	m2	17,390	1 489,00	25 893,71

### 8 - Trubní vedení

5 771,19

23	K	871373121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300	m	3,400	131,00	445,40
24	K	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15 3,14*0,5*2,5*0,15	m3	0,589	2 610,00	1 537,29
			Součet		0,589		
25	K	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu 0,35*2,5*2	m2	1,750	330,00	577,50
			Součet		1,750		
26	M	28611122	Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 315x7,7x5000 mm	kus	1,000	3 211,00	3 211,00

### 91 - Doplnující práce na komunikaci

34 672,46

27	K	919511112R00	Čela propustku z lomového kamene, krycí deska ŽB 0,6*1,7*2+0,5*1,6*0,8*2+0,5*0,7*1,6+0,5*2,1*0,8*2+0,5*2,1*1,15	m3	6,768	5 123,00	34 672,46
			Součet		6,768		

### 93 - Dokončovací práce inženýrských staveb

1 430,00

28	K	934956124R00	Hradítka z dubového dřeva tloušťky 5 cm 0,5*0,65*2	m2	0,650	2 200,00	1 430,00
			Součet		0,650		

### 96 - Bourání konstrukcí

43 640,60

29	K	960191241R00	Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů	m3	8,000	4 225,00	33 800,00
30	K	961041211R00	Bourání mostních základů z betonu prostého	m3	3,150	3 124,00	9 840,60

### 99 - Staveništní přesun hmot

15 158,57

31	K	998324011R00	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	53,002	286,00	15 158,57
----	---	--------------	---	---	--------	--------	-----------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka

**Objekt:** 0004 - 0004 Panelová komunikace

JKSO:

Místo: Psáry

CC-CZ:

Datum: 15. 5. 2018

Objednatel:

Obec Psáry

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. HK

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Franta, Kincl

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	120 637,44
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>120 637,44</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	120 637,44	25 333,86
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>145 971,30</b>
-------------------	--------------	-------------------

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka

**Objekt: 0004 - 0004 Panelová komunikace**

Místo: Psáry

Datum: 15. 5. 2018

Objednatel: Obec Psáry

Projektant:

Projektový ateliér Dlabáček s.r.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel:

Franta, Kincl

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>120 637,44</b>
1 - Zemní práce	25 282,80
5 - Komunikace	66 327,00
97 - Prorážení otvorů	14 722,56
99 - Staveništní přesun hmot	14 305,08
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>120 637,44</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka

Objekt: 0004 - 0004 Panelová komunikace

Místo: Psáry

Datum: 15. 5. 2018

Objednatel: Obec Psáry

Projektant: Projektový ateliér Dlabáček s.r.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel: Franta, Kincl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

120 637,44

### 1 - Zemní práce

25 282,80

1	K	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	90,000	120,00	10 800,00
2	K	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	90,000	96,90	8 721,00
3	K	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	18,000	30,60	550,80
			18*5*0,2		18,000		
			Součet		18,000		
4	K	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	90,000	57,90	5 211,00

### 5 - Komunikace

66 327,00

5	K	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po ztuhnutí tloušťky 10 cm	m2	90,000	63,80	5 742,00
			18*5		90,000		
			Součet		90,000		
6	K	584921111R00	Osazení panelů z předpjatého betonu do 6 t/ks	m2	90,000	190,00	17 100,00
7	M	593800110030	Panel silniční KZD 1 300x200x15 cm	kus	15,000	2 899,00	43 485,00
			90/6		15,000		
			Součet		15,000		

### 97 - Prorážení otvorů

14 722,56

8	K	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	t	51,120	288,00	14 722,56
---	---	--------------	---	---	--------	--------	-----------

### 99 - Staveništní přesun hmot

14 305,08

9	K	998226011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt montovaný	t	60,359	237,00	14 305,08
---	---	--------------	---	---	--------	--------	-----------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka  
**Objekt: 0005 - 0005 Vedlejší a ostatní náklady**

JKSO:  
 Místo: Psáry

CC-CZ:  
 Datum: 15. 5. 2018

Objednatel:  
 Obec Psáry

IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel:  
 Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

IČ:  
 DIČ:

Projektant:  
 Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. HK

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:  
 Franta, Kincl

IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	55 789,35
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>55 789,35</b>
DPH základní 21,00% ze	55 789,35
DPH snížená 15,00% ze	0,00
	11 715,76
	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>	<b>67 505,11</b>

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka

Objekt: 0005 - 0005 Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Psáry

Datum: 15. 5. 2018

Objednatel: Obec Psáry

Projektant: Projektový ateliér Dlabáček s.r.l.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel:

Franta, Kincl

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>55 789,35</b>
1 - Zemní práce	55 789,35
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>55 789,35</b>



# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka

Objekt: 0005 - 0005 Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Psáry

Datum: 15. 5. 2018

Objednatel: Obec Psáry

Projektant: Projektový ateliér Dlabáček s.r.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel: Franta, Kíncl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

55 789,35

### 1 - Zemní práce

55 789,35

1	K	100000026T00	Geodetické vylýčení stavby oprávněnou osobou	ks	1,000	11 000,00	11 000,00
2	K	100000046T00	Geodet. zaměření skut. provedení 3paré+1xelektroni	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00
3	K	100000126T00	Zřízení a likvidace ZS	%	0,025	1 431 574,00	35 789,35

